


ID	Aufgabenname	Anfang	Abschluss	% abgeschlossen	Dauer	Aug 2003			
						3.8	10.8	17.8	24.8
1	Produkt1	01.08.2003	15.08.2003	65%	11t	[Progress bar]			
2	Aufgabenpaket 1.1	01.08.2003	10.08.2003	50%	6t	[Progress bar]			
3	Aufgabenpaket 1.2	05.08.2003	15.08.2003	75%	9t	[Progress bar]			
4	Produkt 2	12.08.2003	29.08.2003	54,55%	14t	[Progress bar]			
5	Aufgabenpaket 2.1	15.08.2003	20.08.2003	0%	4t	[Progress bar]			
6	Aufgabenpaket 2.2	12.08.2003	20.08.2003	30%	7t	[Progress bar]			
7	Aufgabenpaket 2.3	15.08.2003	30.08.2003	90%	11t	[Progress bar]			

Abbildung des PSP als GANTT-Diagramm

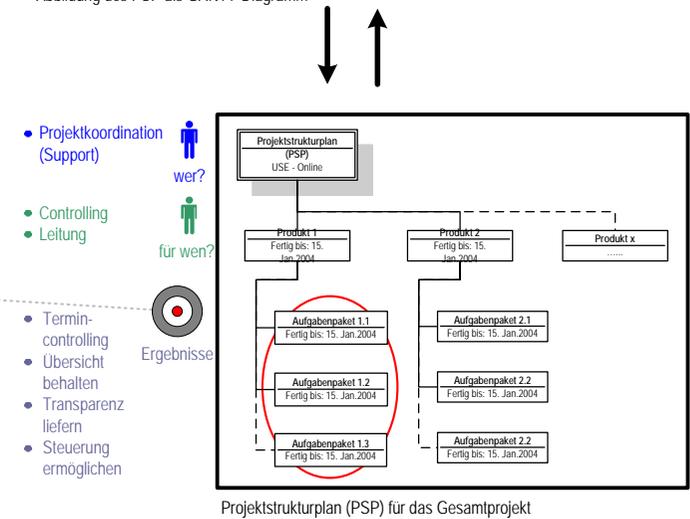

Projektstrukturplan (PSP) für das Gesamtprojekt
